

RAB — Rencana Anggaran Biaya

GowesFit Marketplace • MVP hingga Full Release

Versi: 1.0
Tanggal: Mei 2026
Mata uang: IDR
Disclaimer: Semua angka estimasi berdasarkan riset harga layanan per Mei 2026. Validasi ulang sebelum kontrak ditandatangani.

Daftar Isi

- 1. [Biaya Pra-Development \(One-Time\)](#)
- 2. [Biaya Development per Skenario Kerja Sama](#)
- 3. [Rincian Biaya Operasional 3 Fase](#)
- 4. [Total Biaya Sampai MVP Launch](#)
- 5. [Biaya Menuju Full Release \(Phase 2 & 3\)](#)
- 6. [Proyeksi Revenue 6 Bulan — 3 Skenario](#)
- 7. [P&L Summary & Path to Break-Even](#)

1. Biaya Pra-Development (One-Time)

Biaya ini dikeluarkan **sebelum satu baris kode ditulis** dan wajib ada untuk bisa beroperasi secara legal serta mengaktifkan payment gateway.

1.1 Legal & Badan Usaha

Item	Skenario Hemat (CV)	Skenario Standar (PT)	Keterangan
Pendirian badan usaha (notaris + NIB)	Rp 3.000.000	Rp 7.000.000	Jasa online: Hukumonline, Easybiz
NPWP Perusahaan	Rp 0	Rp 0	Gratis di kantor pajak
Rekening bank perusahaan (setoran awal)	Rp 100.000	Rp 1.000.000	Tergantung bank
Konsultasi Privacy Policy + ToS	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	Min. 1–2 jam konsultasi lawyer
Subtotal Legal	Rp 4.600.000	Rp 11.000.000	

Rekomendasi MVP: Mulai dengan CV (lebih cepat, lebih murah). Upgrade ke PT saat revenue > Rp 50 juta/bulan atau ada investor masuk.

1.2 Domain & Brand

Item	Biaya	Keterangan
Domain gowesfit.com	Rp 200.000/tahun	Via Niagahoster / Domainsia

Domain gowesfit.id	Rp 300.000/tahun	Perlindungan brand lokal
SSL Certificate	Rp 0	Gratis via Cloudflare / Let's Encrypt
Email domain (Google Workspace)	Rp 900.000/tahun	Rp 75.000/bulan — untuk komunikasi profesional
Subtotal Domain & Brand	Rp 1.400.000	

1.3 Marketing Soft Launch

Item	Estimasi Minimum	Estimasi Realistis	Keterangan
Konten visual (Canva Pro 1 bulan)	Rp 75.000	Rp 75.000	Untuk materi onboarding seller
Outreach komunitas (transport, kopi meeting)	Rp 500.000	Rp 2.000.000	Rekrut 50 founding sellers
Foto/video pendek untuk sosmed	Rp 0	Rp 1.500.000	DIY vs. hire kreator
Subtotal Marketing Soft Launch	Rp 575.000	Rp 3.575.000	

1.4 Ringkasan Biaya Pra-Development

```
xychart-beta
  title "Biaya Pra-Development per Skenario (Rp Juta)"
  x-axis ["Legal (CV)", "Legal (PT)", "Domain & Brand", "Marketing Minimum", "Marketing Realistis"]
  y-axis "Biaya (Rp Juta)" 0 --> 12
  bar [4.6, 11, 1.4, 0.6, 3.6]
```

Komponen	Skenario Minimum	Skenario Realistis
Legal & Badan Usaha	Rp 4.600.000	Rp 11.000.000
Domain & Brand	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
Marketing Soft Launch	Rp 575.000	Rp 3.575.000
Total Pra-Development	Rp 6.575.000	Rp 15.975.000

2. Biaya Development per Skenario Kerja Sama

Tiga opsi struktur kerja sama dengan implikasi biaya yang sangat berbeda:

Skenario A — Co-owner (Equity, No Cash)

Developer masuk sebagai mitra dengan kompensasi equity (saham), bukan bayaran tunai.

Item	Biaya Cash	Keterangan
------	------------	------------

Biaya development MVP	Rp 0	Developer diganti equity
Biaya development Phase 2	Rp 0	
Biaya development Phase 3	Rp 0	
Trade-off	—	Dilusi equity 20–40%

Cocok jika: Owner tidak punya modal besar, developer percaya pada visi jangka panjang.

Skenario B — Hybrid (Retainer Kecil + Equity)

Developer dibayar retainer bulanan di bawah pasar, sisanya dikompensasi equity.

Fase	Durasi	Retainer/bulan	Total Cash	Equity
MVP (Phase 1)	4 bulan	Rp 7.500.000	Rp 30.000.000	10–15%
Phase 2	3 bulan	Rp 7.500.000	Rp 22.500.000	—
Phase 3	4 bulan	Rp 7.500.000	Rp 30.000.000	—
Total	11 bulan		Rp 82.500.000	10–15%

Cocok jika: Owner punya modal menengah dan ingin menjaga motivasi developer jangka panjang.

Skenario C — Vendor / Outsource Full (No Equity)

Developer atau tim agensi dibayar penuh sesuai rate pasar, tidak menerima saham.

Fase	Scope	Estimasi Durasi	Biaya
MVP (Phase 1)	Auth, Listing, Browse, Bike Rec, Chat, Payment, Review, QA	16–18 minggu	Rp 80.000.000 – Rp 150.000.000
Phase 2	Bike Fitting integration, Verified Listing, Subscription, Komunitas Profile	10–12 minggu	Rp 50.000.000 – Rp 90.000.000
Phase 3	Bike Passport, Inspector Network, Price Valuation Tool	12–16 minggu	Rp 60.000.000 – Rp 100.000.000
Total Full Release		38–46 minggu	Rp 190.000.000 – Rp 340.000.000

Cocok jika: Ada funding eksternal / investor, atau owner ingin tetap 100% saham.

Perbandingan Total Biaya Development

```
xychart-beta
  title "Total Biaya Development hingga Full Release (Rp Juta)"
  x-axis ["Co-owner (MVP)", "Co-owner (Full)", "Hybrid (MVP)", "Hybrid (Full)", "Vendor (MVP)", "Vendor (Full)"]
```

y-axis "Biaya Cash (Rp Juta)" 0 --> 350
bar [0, 0, 30, 82.5, 115, 265]

3. Rincian Biaya Operasional 3 Fase

Fase 1 — Bulan 1–3: Pre-Traction (Free Tier Maksimal)

Target fase ini: Platform live, 200+ listing aktif, transaksi pertama terjadi.

Filosofi: Pakai semaksimal mungkin free tier — belum ada revenue yang perlu dikejar margin.

Layanan	Fungsi	Free Tier Limit	Biaya/bulan
Hostinger VPS KVM 1	Hosting app Next.js	—	Rp 60.000
Supabase Free	Database + Auth + Realtime chat	500MB DB, 200 concurrent	Rp 0
Cloudinary Free	Storage & resize foto listing	25GB storage, 25GB bandwidth	Rp 0
Resend Free	Email transaksional (OTP, notif)	3.000 email/bulan	Rp 0
Zenziva SMS	OTP verifikasi nomor HP	Pay-per-use	Rp 60.000–150.000
Sentry Free	Error monitoring	5.000 error events/bulan	Rp 0
Posthog Free	Analytics & session replay	1 juta events/bulan	Rp 0
Cloudflare Free	DNS + CDN + SSL	Unlimited bandwidth	Rp 0
Domain (amortisasi)	—	—	Rp 42.000
Google Workspace	Email profesional tim	—	Rp 75.000

pie title Komposisi Biaya Operasional Fase 1 – Total ~Rp 215.000/bulan
"Hosting VPS" : 60000
"Zenziva SMS OTP" : 105000
"Domain (amortisasi)" : 42000
"Google Workspace" : 75000

	Minimum	Maksimum
Total Biaya Operasional Fase 1	Rp 177.000/bulan	Rp 327.000/bulan
Total 3 Bulan	Rp 531.000	Rp 981.000

Kapasitas Free Tier: Supabase Free cukup untuk ~50.000 listing + 200.000 pesan. Cloudinary Free cukup untuk ~1.000 listing × 5 foto. Lebih dari cukup untuk 3 bulan pertama.

Fase 2 — Bulan 4–6: Early Growth (Mulai Scale)

Target fase ini: 500–1.100 listing aktif, 50–130 transaksi/bulan, revenue mulai masuk.

Filosofi: Upgrade layanan yang mulai mentok limitnya, tapi tetap lean.

Layanan	Perubahan dari Fase 1	Biaya/bulan
Hostinger VPS KVM 2	Upgrade: 2 vCPU, 8GB RAM (traffic naik)	Rp 120.000
Supabase Pro	Upgrade: DB > 500MB, daily backup aktif	Rp 408.000 (~\$25)
Cloudinary Free	Masih cukup jika < 25GB bandwidth	Rp 0
Resend Free	Masih cukup jika < 3.000 email/bulan	Rp 0
Zenziva SMS	Volume OTP naik seiring user baru	Rp 180.000–300.000
Sentry Free	Masih cukup	Rp 0
Posthog Free	Masih cukup	Rp 0
Cloudflare Free	Masih cukup	Rp 0
Domain (amortisasi)	—	Rp 42.000
Google Workspace	—	Rp 75.000
Midtrans fee	Per-transaksi (bukan bulanan)	Variable

```
pie title Komposisi Biaya Operasional Fase 2 – Total ~Rp 862.000/bulan
  "Hosting VPS KVM 2" : 120000
  "Supabase Pro" : 408000
  "Zenziva SMS OTP" : 240000
  "Domain (amortisasi)" : 42000
  "Google Workspace" : 75000
```

	Minimum	Maksimum
Total Biaya Operasional Fase 2	Rp 765.000/bulan	Rp 945.000/bulan
Total 3 Bulan	Rp 2.295.000	Rp 2.835.000

Biaya Midtrans per transaksi (variable):

- VA: Rp 4.000 flat
- E-wallet/QRIS: ~1.5% dari nilai transaksi
- Disbursement Iris ke seller: Rp 5.000/payout
- **Rata-rata cost per transaksi: ~Rp 100.000** (untuk avg ticket Rp 6,3 juta)

Fase 3 — Bulan 7–12: Scale (Mulai Profitable)


Target fase ini: 1.000+ listing aktif, 200+ transaksi/bulan, GMV Rp 1,2 miliar/bulan.

Filosofi: Investasi infrastruktur untuk reliability & performance. Revenue sudah ada, margin bisa cover biaya.

Layanan	Perubahan	Biaya/bulan
VPS / Managed (upgrade)	Hostinger KVM 4 atau pindah ke dedicated	Rp 250.000–500.000
Supabase Pro	Tetap, atau upgrade ke team jika DB > 8GB	Rp 408.000–816.000
Cloudinary Free → Plus	Jika bandwidth foto > 25GB/bulan	Rp 0–1.454.000 (~\$89)
Resend Starter	Jika email > 3.000/bulan	Rp 0–326.000 (~\$20)
Zenziva SMS	Volume lebih tinggi (~2.000 OTP/bulan)	Rp 600.000
Sentry Free / Team	Jika error events > 5.000/bulan	Rp 0–424.000 (~\$26)
Posthog Free	Masih dalam free tier	Rp 0
Cloudflare Pro	Jika butuh WAF & advanced analytics	Rp 0–327.000 (~\$20)
Domain (amortisasi)	—	Rp 42.000
Google Workspace	—	Rp 75.000
Customer Support tool	Crisp / Intercom Free	Rp 0–500.000

	Minimum	Maksimum
Total Biaya Operasional Fase 3	Rp 1.375.000/bulan	Rp 4.244.000/bulan
Total 6 Bulan	Rp 8.250.000	Rp 25.464.000

Ringkasan Biaya Operasional: Fase 1 → 3

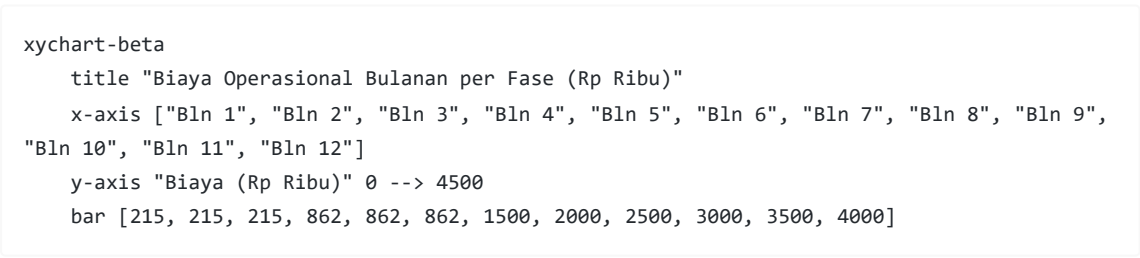

Fase	Periode	Biaya/bulan	Total
Fase 1	Bulan 1–3	Rp 177.000–327.000	Rp 531.000–981.000
Fase 2	Bulan 4–6	Rp 765.000–945.000	Rp 2.295.000–2.835.000
Fase 3	Bulan 7–12	Rp 1.375.000–4.244.000	Rp 8.250.000–25.464.000
Total 12 Bulan			Rp 11.076.000 – Rp 29.280.000

4. Total Biaya Sampai MVP Launch

Rekap seluruh pengeluaran dari hari pertama hingga platform live (Milestone M9 — Soft Launch Beta):

Skenario Co-owner (Paling Efisien)

Komponen	Skenario Minimum	Skenario Realistis
Biaya Pra-Development	Rp 6.575.000	Rp 15.975.000
Biaya Development MVP	Rp 0	Rp 0
Biaya Operasional Bulan 1–4 (pra-launch)	Rp 708.000	Rp 1.308.000
Buffer tak terduga (10%)	Rp 728.000	Rp 1.728.000
TOTAL SAMPAI MVP LAUNCH	Rp 8.011.000	Rp 19.011.000

Skenario Hybrid (Retainer + Equity)

Komponen	Biaya
Biaya Pra-Development	Rp 15.975.000
Biaya Development MVP (4 bulan retainer)	Rp 30.000.000
Biaya Operasional Bulan 1–4	Rp 1.308.000
Buffer tak terduga (10%)	Rp 4.728.000
TOTAL SAMPAI MVP LAUNCH	Rp 52.011.000

Skenario Vendor (Outsource Penuh)

Komponen	Minimum	Maksimum
Biaya Pra-Development	Rp 15.975.000	Rp 15.975.000
Biaya Development MVP	Rp 80.000.000	Rp 150.000.000
Biaya Operasional Bulan 1–4	Rp 1.308.000	Rp 1.308.000
Buffer tak terduga (10%)	Rp 9.728.000	Rp 16.728.000
TOTAL SAMPAI MVP LAUNCH	Rp 107.011.000	Rp 184.011.000

```
xychart-beta
  title "Total Biaya hingga MVP Launch per Skenario (Rp Juta)"
  x-axis ["Co-owner Min", "Co-owner Realistis", "Hybrid", "Vendor Min", "Vendor Maks"]
  y-axis "Total Biaya (Rp Juta)" 0 --> 200
  bar [8, 19, 52, 107, 184]
```

5. Biaya Menuju Full Release (Phase 2 & 3)

Full release mencakup semua fitur yang menjadikan GowesFit platform sepeda paling lengkap di Indonesia.

Phase 2 — Bulan 5–8: Killer Feature Activation

Fitur yang dibangun:

- Integrasi Bike Fitting Tool ↔ Marketplace (Level 2, pose-based)
- Verified Bike Listing badge (serial number verification)
- Seller Subscription premium
- Komunitas profile linking (verifikasi keanggotaan klub)

Komponen	Co-owner	Hybrid	Vendor
Development Phase 2	Rp 0	Rp 22.500.000	Rp 50.000.000–90.000.000
Operasional Fase 2 (3 bulan)	Rp 2.295.000–2.835.000	sama	sama
Marketing & Growth	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
Total Phase 2	Rp 5.295.000–5.835.000	Rp 29.795.000	Rp 62.295.000–102.835.000

Phase 3 — Bulan 9–12: Moat Building (Full Platform)

Fitur yang dibangun:

- Bike Passport (riwayat kepemilikan & servis)
- Bike Inspector Network (pilot Jakarta + Bandung)
- Price Valuation Tool (berbasis data transaksi internal)
- Compatibility Checker (frame + komponen)

Komponen	Co-owner	Hybrid	Vendor
Development Phase 3	Rp 0	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000–100.000.000
Operasional Fase 3 (6 bulan)	Rp 8.250.000–25.464.000	sama	sama
Marketing & Growth	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
Bike Inspector pilot (partner bengkel)	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Total Phase 3	Rp 16.250.000–33.464.000	Rp 51.250.000–68.464.000	Rp 91.250.000–148.464.000

Total Biaya Keseluruhan (MVP → Full Release)

```
xychart-beta
  title "Total Biaya Keseluruhan MVP → Full Release (Rp Juta)"
  x-axis ["Co-owner", "Hybrid", "Vendor Min", "Vendor Maks"]
  y-axis "Total (Rp Juta)" 0 --> 440
  bar [49, 169, 259, 439]
```

Fase	Co-owner	Hybrid	Vendor (Min)	Vendor (Maks)
Pra-Development	Rp 15.975.000	Rp 15.975.000	Rp 15.975.000	Rp 15.975.000

Development MVP	Rp 0	Rp 30.000.000	Rp 80.000.000	Rp 150.000.000
Operasional Fase 1 (3 bln)	Rp 981.000	Rp 981.000	Rp 981.000	Rp 981.000
Development Phase 2	Rp 0	Rp 22.500.000	Rp 50.000.000	Rp 90.000.000
Operasional Fase 2 (3 bln)	Rp 2.835.000	Rp 2.835.000	Rp 2.835.000	Rp 2.835.000
Development Phase 3	Rp 0	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 100.000.000
Operasional Fase 3 (6 bln)	Rp 25.464.000	Rp 25.464.000	Rp 25.464.000	Rp 25.464.000
Marketing total	Rp 8.000.000	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
Buffer 10%	Rp 5.326.000	Rp 14.276.000	Rp 26.526.000	Rp 41.526.000
GRAND TOTAL	~Rp 58.581.000	~Rp 157.031.000	~Rp 291.781.000	~Rp 456.781.000

6. Proyeksi Revenue 6 Bulan — 3 Skenario

Asumsi Dasar (Berlaku di Semua Skenario)

Parameter	Nilai	Catatan
Rata-rata nilai transaksi	Rp 6.300.000	Weighted avg dari semua kategori
Fee rekber (aktif bulan 2)	1% → target 2%	Validasi via customer research
Avg fee per transaksi (1%)	Rp 63.000	
Listing fee	Rp 10.000/listing	30% seller bayar (asumsi)
Featured Listing	Rp 25.000/7 hari	
Seller Subscription	Rp 49.000/bulan	Aktif bulan 4+, 5% seller aktif
Bulan 1	Free semua	Bangun traction, belum charging

6.1 Skenario Pesimis (60% dari Target PRD)

Asumsi: Rekrut founding sellers lebih susah dari ekspektasi, word of mouth lambat, konversi rendah.

Volume Listing & Transaksi

Bulan	Listing Aktif	Transaksi Selesai	Listing Boosted	Subscribers
1	100	0	0	0
2	200	8	5	0
3	300	15	12	0

4	400	25	20	20
5	500	35	30	25
6	600	45	40	30
Total		128 transaksi	107 boost	—

Revenue per Sumber

Bulan	Transaction Fee	Listing Fee	Featured Listing	Subscription	Total
1	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Rp 504.000	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 0	Rp 1.229.000
3	Rp 945.000	Rp 900.000	Rp 300.000	Rp 0	Rp 2.145.000
4	Rp 1.575.000	Rp 1.200.000	Rp 500.000	Rp 980.000	Rp 4.255.000
5	Rp 2.205.000	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 1.225.000	Rp 5.680.000
6	Rp 2.835.000	Rp 1.800.000	Rp 1.000.000	Rp 1.470.000	Rp 7.105.000
Total	Rp 8.064.000	Rp 6.000.000	Rp 2.675.000	Rp 3.675.000	Rp 20.414.000

GMV 6 bulan (pesimis): ~Rp 806.400.000 (128 trx × Rp 6,3 juta)

6.2 Skenario Realistis (Target PRD)

Asumsi: 50 founding sellers berhasil direkrut, word of mouth tumbuh steady, konversi 10%.

Volume Listing & Transaksi

Bulan	Listing Aktif	Transaksi Selesai	Listing Boosted	Subscribers
1	150	0	0	0
2	350	15	10	0
3	500	50	30	0
4	700	75	50	35
5	900	100	75	45
6	1.100	130	100	55
Total		370 transaksi	265 boost	—

Revenue per Sumber

Bulan	Transaction Fee	Listing Fee	Featured Listing	Subscription	Total
1	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Rp 945.000	Rp 1.050.000	Rp 250.000	Rp 0	Rp 2.245.000

3	Rp 3.150.000	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 0	Rp 5.400.000
4	Rp 4.725.000	Rp 2.100.000	Rp 1.250.000	Rp 1.715.000	Rp 9.790.000
5	Rp 6.300.000	Rp 2.700.000	Rp 1.875.000	Rp 2.205.000	Rp 13.080.000
6	Rp 8.190.000	Rp 3.300.000	Rp 2.500.000	Rp 2.695.000	Rp 16.685.000
Total	Rp 23.310.000	Rp 10.650.000	Rp 6.625.000	Rp 6.615.000	Rp 47.200.000

GMV 6 bulan (realistik): ~Rp 2.331.000.000 (370 trx × Rp 6,3 juta)

6.3 Skenario Optimis (1,5× Target PRD)

Asumsi: Viral di komunitas, Bike Recommendation jadi hit, word of mouth masif.

Volume Listing & Transaksi

Bulan	Listing Aktif	Transaksi Selesai	Listing Boosted	Subscribers
1	250	0	0	0
2	600	30	25	0
3	900	90	70	0
4	1.300	150	110	65
5	1.700	200	160	85
6	2.000	260	200	100
Total		730 transaksi	565 boost	—

Revenue per Sumber

Bulan	Transaction Fee	Listing Fee	Featured Listing	Subscription	Total
1	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0
2	Rp 1.890.000	Rp 1.800.000	Rp 625.000	Rp 0	Rp 4.315.000
3	Rp 5.670.000	Rp 2.700.000	Rp 1.750.000	Rp 0	Rp 10.120.000
4	Rp 9.450.000	Rp 3.900.000	Rp 2.750.000	Rp 3.185.000	Rp 19.285.000
5	Rp 12.600.000	Rp 5.100.000	Rp 4.000.000	Rp 4.165.000	Rp 25.865.000
6	Rp 16.380.000	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.900.000	Rp 32.280.000
Total	Rp 45.990.000	Rp 19.500.000	Rp 14.125.000	Rp 12.250.000	Rp 91.865.000

GMV 6 bulan (optimis): ~Rp 4.599.000.000 (730 trx × Rp 6,3 juta)

Perbandingan Revenue 3 Skenario

```
xychart-beta
  title "Total Revenue 6 Bulan per Skenario (Rp Juta)"
  x-axis ["Pesimis", "Realistis", "Optimis"]
  y-axis "Revenue (Rp Juta)" 0 --> 100
  bar [20.4, 47.2, 91.9]
```

```
xychart-beta
  title "Revenue Bulanan – Perbandingan 3 Skenario (Rp Juta)"
  x-axis ["Bln 1", "Bln 2", "Bln 3", "Bln 4", "Bln 5", "Bln 6"]
  y-axis "Revenue (Rp Juta)" 0 --> 35
  line [0, 1.2, 2.1, 4.3, 5.7, 7.1]
  line [0, 2.2, 5.4, 9.8, 13.1, 16.7]
  line [0, 4.3, 10.1, 19.3, 25.9, 32.3]
```

(Biru = Pesimis · Hijau = Realistis · Merah = Optimis)

7. P&L Summary & Path to Break-Even

P&L 6 Bulan — Skenario Realistis, Co-owner

Bulan	Revenue	Biaya Variable (Midtrans)	Biaya Tetap	Net Profit	Kumulatif
1	Rp 0	Rp 0	Rp 215.000	(Rp 215.000)	(Rp 215.000)
2	Rp 2.245.000	Rp 800.000	Rp 215.000	(Rp 770.000)	(Rp 985.000)
3	Rp 5.400.000	Rp 5.000.000	Rp 215.000	(Rp 185.000)	(Rp 1.170.000)
4	Rp 9.790.000	Rp 7.500.000	Rp 862.000	Rp 1.428.000	Rp 258.000
5	Rp 13.080.000	Rp 10.000.000	Rp 862.000	Rp 2.218.000	Rp 2.476.000
6	Rp 16.685.000	Rp 13.000.000	Rp 862.000	Rp 2.823.000	Rp 5.299.000

Catatan: Biaya variable bulan 3 tinggi karena 50 transaksi × cost Midtrans ~Rp 100.000/trx. Di model ini mengasumsikan fee rekber sudah dinaikkan ke 1.5–2% sehingga mulai menghasilkan margin positif di bulan 4.

Titik Break-Even Operasional: Bulan 4

Dengan skenario co-owner (no dev cost) dan fee rekber 1.5–2%, platform sudah **operasionally break-even di bulan 4**. Return on investment penuh (termasuk biaya pra-development ~Rp 16 juta) tercapai di **bulan 5–6**.

Titik Break-Even Skenario Vendor

Dengan total investasi Rp 107–184 juta dan net revenue realistis ~Rp 3–5 juta/bulan di awal:

- Break-even: **Bulan 24–36** (2–3 tahun)
- Membutuhkan scaling ke skenario optimis untuk mempercepatnya

Rekomendasi Finansial

1. **Prioritaskan co-owner model** — ROI terbaik, risiko terendah. Break-even operasional di bulan 4.

- 2. **Naikkan fee rekber ke 1.5–2% sejak bulan 2** — Fee 1% matematik rugi. Validasi dulu via riset apakah seller/buyer mau menerima.
- 3. **Push Featured Listing agresif sejak bulan 2** — Margin 84%, tidak butuh transaksi terjadi. Ini revenue paling aman di fase awal.
- 4. **Subscription jadi target upsell bulan 4+** — Recurring, margin 92%, predictable. Target 5% dari seller aktif.
- 5. **Jangan bakar biaya operasional sebelum traction terbukti** — Free tier cukup untuk 3 bulan pertama. Upgrade hanya saat data menunjukkan pertumbuhan nyata.

Lampiran Implementasi Midtrans dan Potongannya

Channel	MDR	Biaya MDR	PPN 11%	Total Potong	Diterima Penjual
QRIS (reguler)	0.7%	Rp 700	Rp 77	Rp 777	Rp 99.223
GoPay / ShopeePay	2%	Rp 2.000	Rp 220	Rp 2.220	Rp 97.780
Virtual Account (BCA/Mandiri/BNI/BRI/Permata)	flat	Rp 4.000	Rp 440	Rp 4.440	Rp 95.560
Kartu Kredit (domestik)	2.9% + Rp 2.000	Rp 4.900	Rp 539	Rp 5.439	Rp 94.561
Kartu Kredit (internasional)	3.2% + Rp 2.000	Rp 5.200	Rp 572	Rp 5.772	Rp 94.228
Indomaret / Alfamart	flat	Rp 5.000	Rp 550	Rp 5.550	Rp 94.450
Akulaku / Kredivo (paylater)	~3.5–6.5%	~Rp 3.500–6.500	~Rp 385–715	±Rp 7.215	±Rp 92.785
Direct Debit (BCA OneKlik / CIMB Clicks)	~1.5–2%	Rp 1.500–2.000	Rp 165–220	~Rp 2.220	±Rp 97.780

Dokumen ini adalah bagian dari paket proposal GowesFit Marketplace. Lihat juga: `proposal-bisnis-gowesfitmarketplace.md` untuk konteks bisnis lengkap.
